

h p
m e



FUNDACIONES

Proceso de Ejecución de Fundaciones de Hormigón Armado

Las fundaciones proyectadas fueron ejecutadas mediante un proceso constructivo secuencial y controlado, considerando criterios estructurales, topográficos y de calidad en obra. Cada etapa fue desarrollada conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, asegurando la correcta transmisión de cargas al terreno y la durabilidad del sistema estructural.

h p
E o

FASE 01

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Corresponde a las labores preliminares destinadas a habilitar el área de trabajo, contemplando el despeje del terreno, retiro de material orgánico y elementos ajenos al proyecto. Se realiza la nivelación inicial de la superficie y la habilitación de accesos para maquinaria, equipos y personal de obra.



FASE 02

LIMPIEZA Y TRAZADO TOPOGRÁFICO

Se efectúa el replanteo general del proyecto mediante instrumentos topográficos de precisión, materializando los ejes estructurales, niveles y dimensiones definidas en los planos de fundaciones. Esta etapa permite verificar alineamientos, escuadrías y cotas de excavación, garantizando la correcta ubicación de cada elemento estructural.



FASE 03**EXCAVACIÓN DE FUNDACIONES**

Se ejecutan las excavaciones correspondientes a zapatas, vigas de fundación y elementos estructurales enterrados, respetando las dimensiones y profundidades especificadas en la ingeniería del proyecto. Las excavaciones son inspeccionadas previamente a su recepción, verificando la capacidad portante del terreno natural y la ausencia de material suelto o contaminado.



FASE 04**EMPLANTILLADO DE HORMIGÓN**

Una vez recepcionadas las excavaciones, se procede a la ejecución del emplantillado mediante una capa de hormigón de limpieza de baja resistencia, cuya función es proporcionar una superficie nivelada y estable para el montaje de las armaduras. Esta solución evita el contacto directo del acero con el terreno, asegurando el correcto recubrimiento del hormigón estructural.



FASE 05

ARMADURA DE ACERO DE REFUERZO

Se confeccionan y montan las armaduras de acero de acuerdo con los planos estructurales, considerando diámetros, separaciones, longitudes de anclaje y empalmes especificados por la ingeniería. Durante su instalación se verifica el correcto posicionamiento mediante separadores y distanciadores, garantizando los recubrimientos mínimos exigidos para la protección contra agentes ambientales y la adecuada adherencia con el hormigón.



FASE 06

ENCOFRADO Y MOLDAJES

Se instalan los moldajes perimetrales y elementos de confinamiento necesarios para la ejecución de vigas de fundación y sobrecimientos, asegurando su estabilidad dimensional durante el hormigonado. Los encofrados son alineados y rigidizados para mantener las tolerancias geométricas establecidas en el proyecto estructural.



FASE 07

HORMIGONADO


El hormigonado se realiza mediante hormigón premezclado de resistencia especificada en el diseño estructural, considerando un procedimiento continuo de colocación y compactación mecánica mediante vibradores de inmersión. Este proceso permite eliminar vacíos y garantizar una adecuada densificación del material, optimizando su comportamiento estructural y durabilidad.



FASE 08

CURADO DE HORMIGÓN

Finalizado el proceso de hormigonado, se ejecutan las labores de curado destinadas a controlar la pérdida prematura de humedad durante el fraguado inicial. El objetivo es asegurar el correcto desarrollo de las resistencias mecánicas del hormigón y minimizar la aparición de fisuras producto de retracciones superficiales.

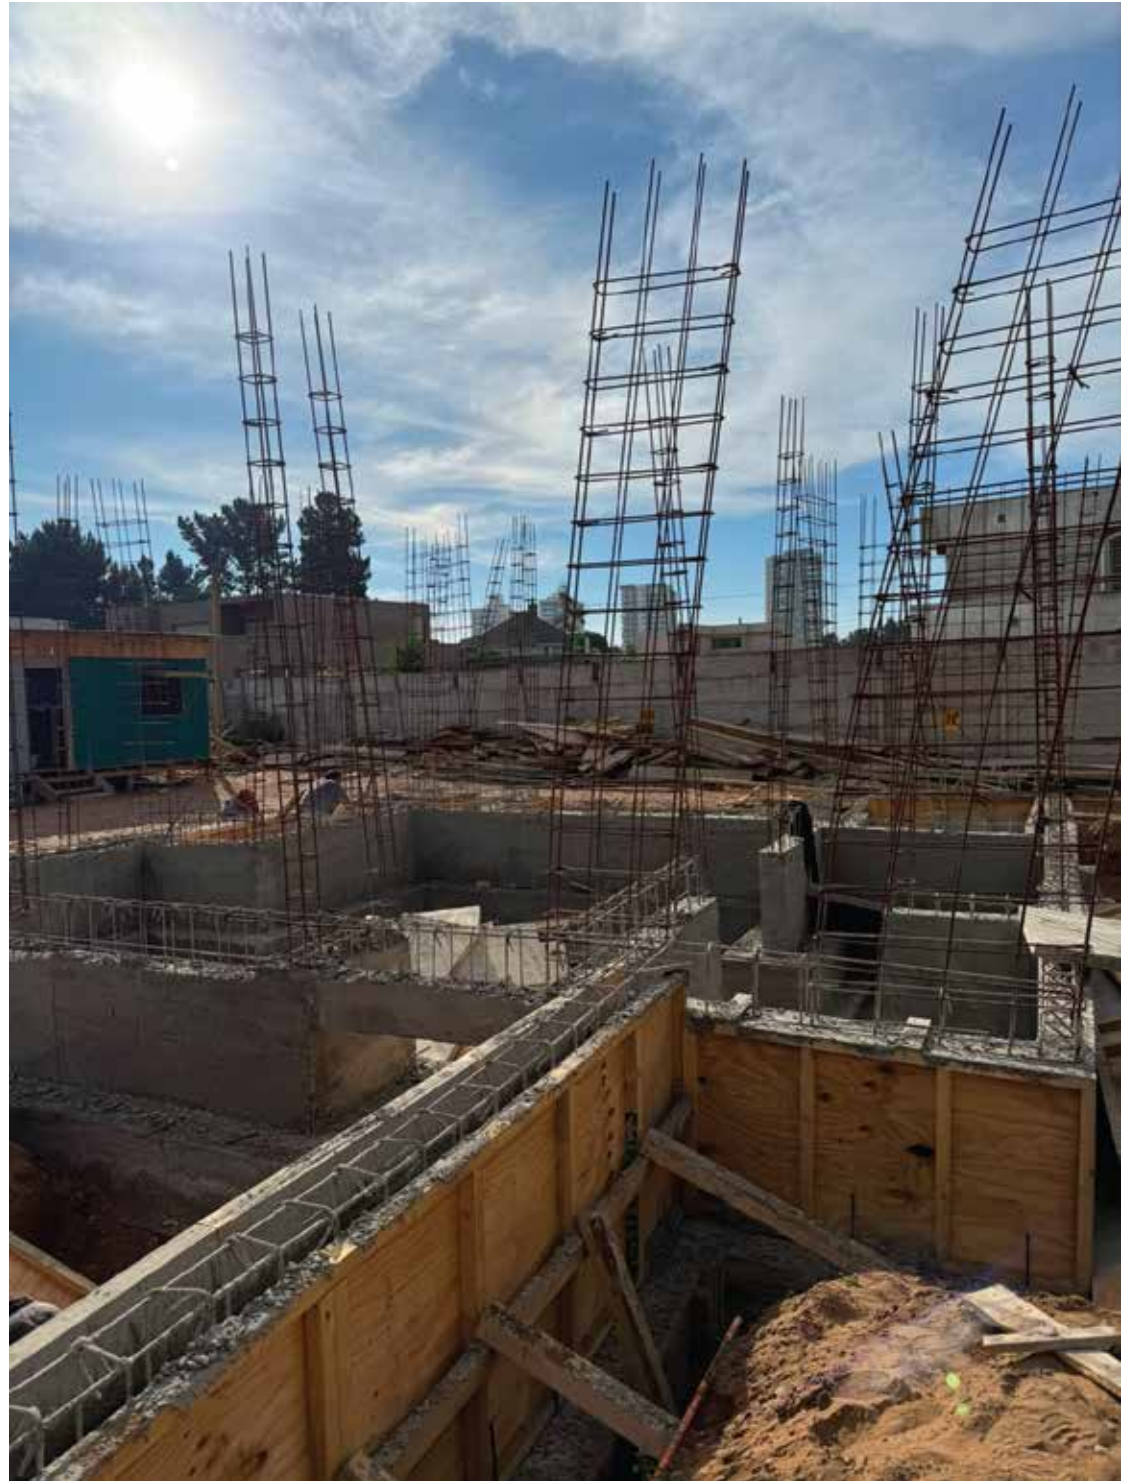

FASE 09

DESMOLDE Y RECEPCIÓN DE FUNDACIONES

Cumplidos los tiempos mínimos establecidos para el desarrollo inicial de resistencia, se procede al retiro de los moldajes y elementos auxiliares de construcción. Posteriormente, se realiza una inspección visual y dimensional de las fundaciones ejecutadas, verificando niveles, alineamientos, terminaciones superficiales y la correcta conformación de los elementos estructurales antes del inicio de las etapas constructivas superiores.





HBMC

Gestión y Ejecución
Servicios Constructivos
Maquinaria Especializada


@constructorahbmc
Buscanos


companyhbmc@gmail.com
Escribenos


+56 9 6842 7880
Llamanos
